

INTRODUCCIÓN

La inversión pública tiene un rol muy importante en el proceso de desarrollo económico y social de un país, en ese sentido el Gobierno de El Salvador ejecuta diversos programas y proyectos, contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), orientados a atender necesidades y demandas de la población.

El presente documento muestra el comportamiento de la ejecución financiera de los programas y proyectos que conforman el PAIP 2015 al mes de septiembre, que asciende al monto de \$1,028.46 millones. Los programas y proyectos son ejecutados por las instituciones del Sector Público No Financiero (SPNF), pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre otras; y la información se presenta clasificada por tipo de presupuesto y/o programas especiales, sector de actividad, fuentes de financiamiento, estructura del sector público, instituciones y programas/proyectos de cada una de éstas, conforme a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en las aplicaciones informáticas correspondientes.


I. Información General

1.1 Composición del Programa

El PAIP 2015 vigente al mes de septiembre por valor de \$1,028.46 millones equivalente al 3.9% del PIB¹, reporta un incremento neto de \$0.91 millones con respecto al PAIP vigente al mes de agosto, debido a ajustes en los programas Institucionales del FISDL, MOP, MINSAL, MAG, MH, FSV y CENTA.

En el Gráfico No.1 se presenta la composición por tipo de presupuesto y/o programas especiales.


**Gráfico No.1
Composición del PAIP 2015**

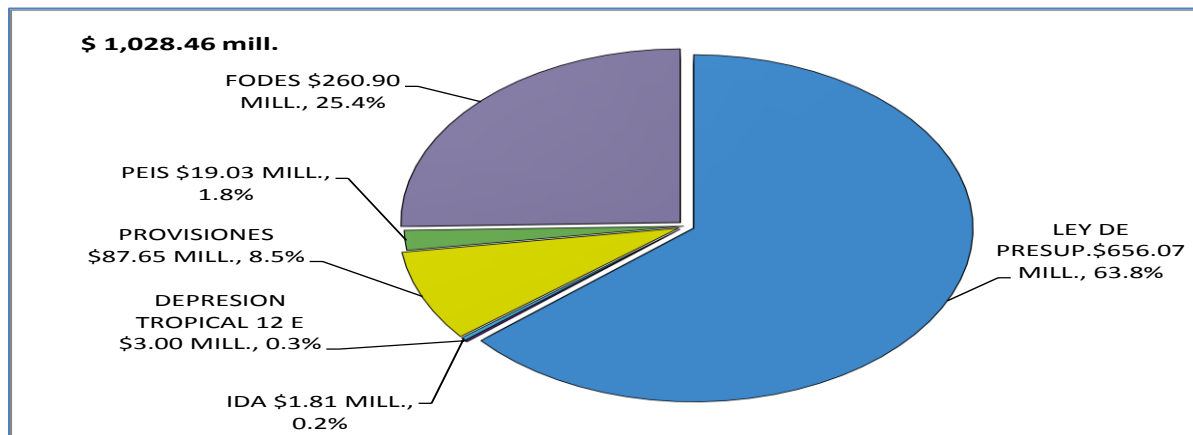

1.2 Distribución del PAIP 2015, por Sector de Actividad

De los \$1,028.46 millones del PAIP 2015 vigente al mes de septiembre, \$487.03 millones (47.4%) corresponden a proyectos del sector económico, \$470.45 millones (45.7%) a proyectos del sector social, y \$70.98 millones (6.9%) a proyectos del sector seguridad pública y justicia.

**Gráfico No.2
PAIP 2015 por Sector de Actividad, al mes de septiembre**

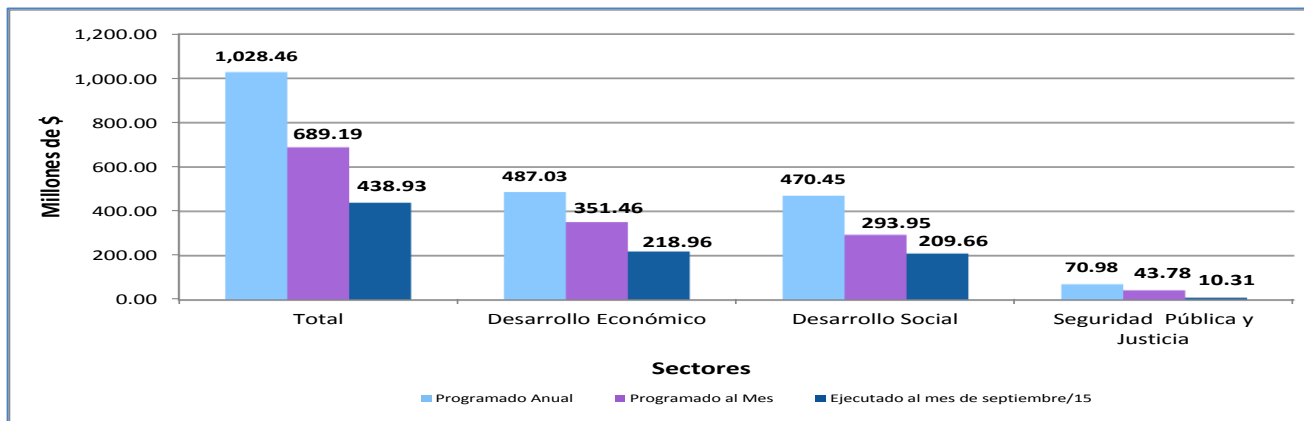


¹PIB: US\$26,205.3 millones.

II. Comportamiento del PAIP 2015

2.1 Composición del PAIP 2015, por Fuente de Financiamiento.

Los proyectos que conforman el PAIP 2015 vigente al mes de septiembre, se financian en un 54.0% corresponden a fuentes internas y 46.0% a fuentes externas.


Gráfico No.3
Avance PAIP 2015 por Fuente de Financiamiento, al mes de septiembre

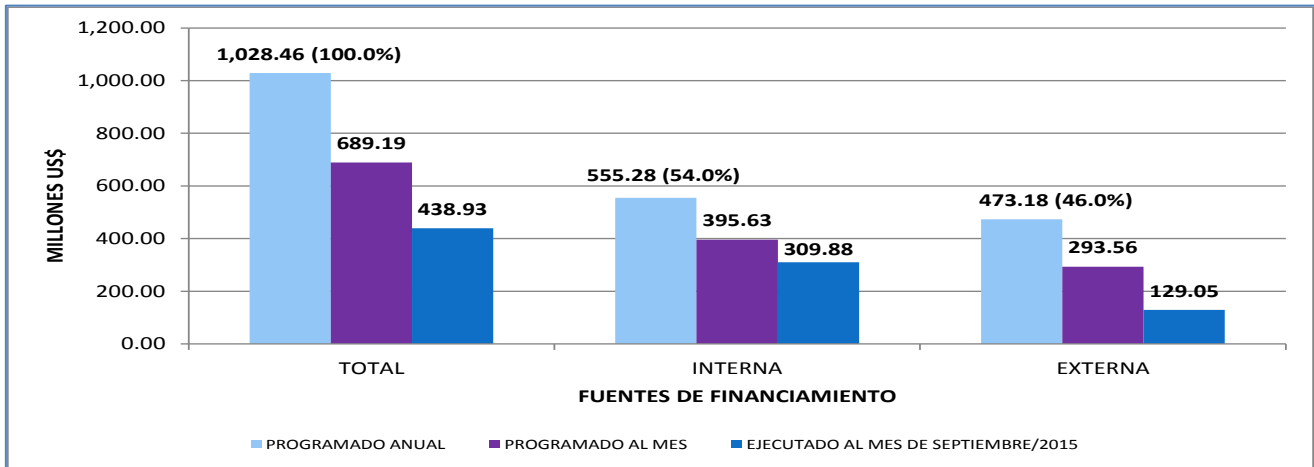

2.2 Composición del PAIP 2015, por Estructura del Sector Público

Del total de \$1,028.46 millones que conforman el PAIP 2015 al mes de septiembre, el 38.2% de los recursos están asignados a proyectos de instituciones del Gobierno Central, el 19.0% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 17.0% de Instituciones Descentralizadas No Empresariales, el 25.3% son recursos FODES y el 0.5% son recursos para proyectos de otras entidades, como se muestra en el cuadro No.1.


Gráfico No.4
Avance PAIP 2015 por Estructura del Sector Público, al mes de septiembre

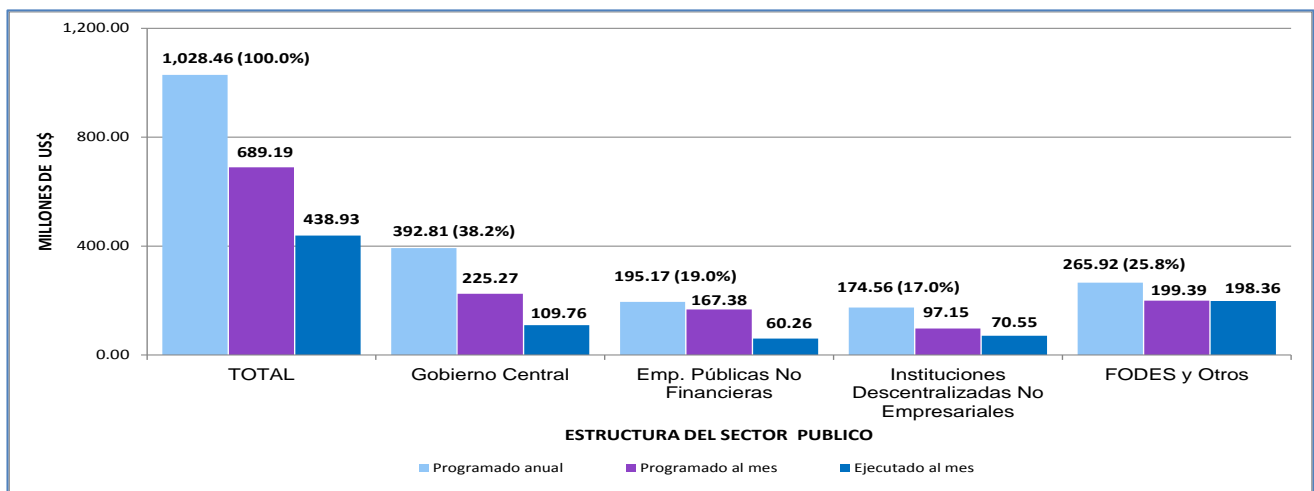

2.3 Avance en el uso de los Recursos del PAIP

De acuerdo a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en los Sistemas de Información, al cierre del mes de septiembre se reporta un monto de fondos comprometidos equivalente al 63.5% del PAIP vigente.

Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2015 al mes de septiembre*

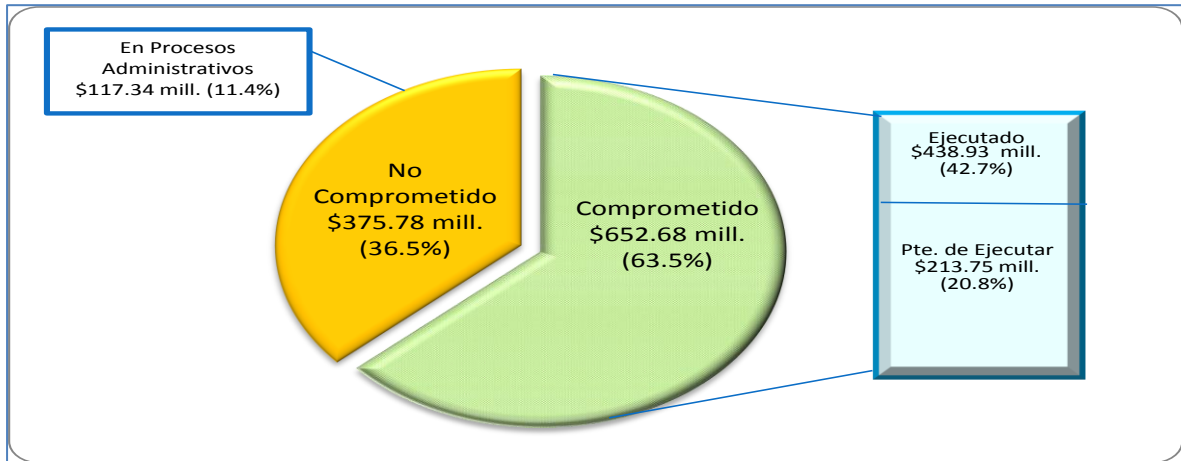


*Incluye FODES

2.4 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de septiembre, durante los últimos 6 años (2010 – 2015).

Gráfico No.6
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de septiembre 2010 - 2015

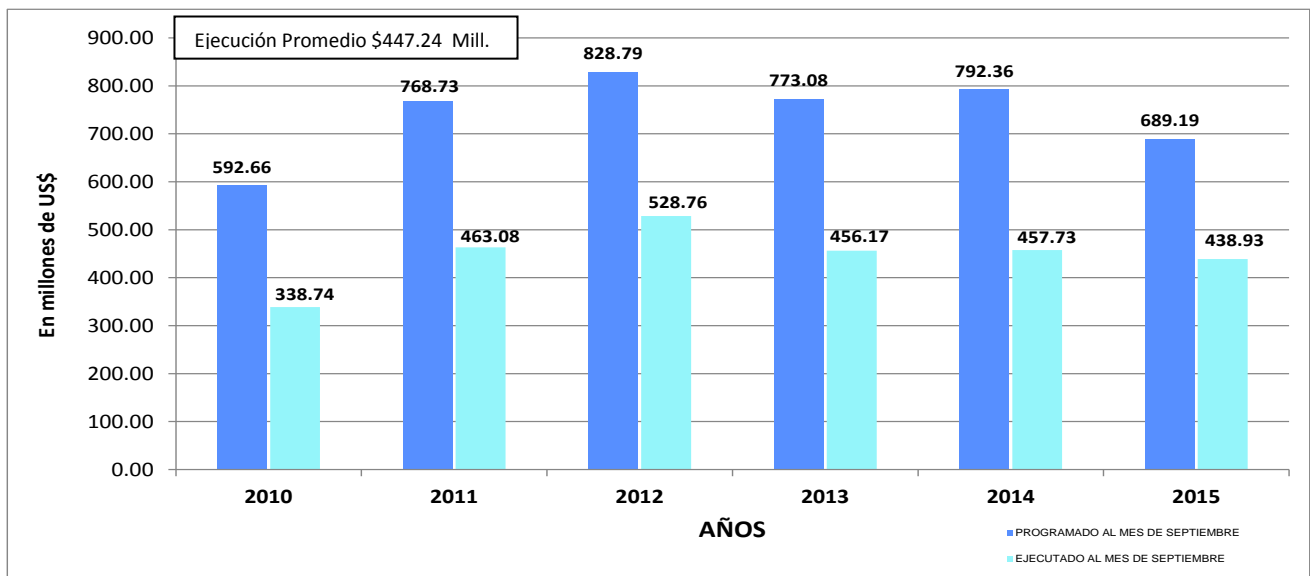

2.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

Cuadro No.1
Programación / Ejecución Financiera del PAIP 2015, al mes de septiembre, por Institución
 (En millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Programas/ Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO AL MES DE SEPTIEMBRE		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE SEPTIEMBRE	
				TOTAL	SUB TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO CENTRAL	253	392.82	225.27	221.98	109.76	170.85	83.45
VMVDU	7	67.32	41.95	48.54	25.70	18.78	6.18
MOP	58	62.25	29.05	36.12	21.48	26.12	8.78
MINSAL	123	58.39	41.07	40.09	12.36	18.31	16.11
MAG	10	53.04	30.75	30.95	20.93	22.10	12.10
DGCP - MJSP	7	23.83	23.46	2.64	0.11	21.18	16.23
MINED	9	20.00	13.04	14.60	7.44	5.40	2.88
CSJ	7	18.22	16.82	12.06	8.08	6.16	5.61
PNC - MJSP	5	15.56	3.43	10.43	2.07	5.13	1.45
FGR	1	13.23	-	-	-	13.23	-
VMT	1	13.10	5.65	7.02	1.66	6.08	-
MARN	6	13.08	4.58	4.12	2.50	8.96	5.55
MH	2	10.05	1.54	2.11	1.50	7.94	6.53
SIS CAPRES	5	7.08	0.92	1.07	0.69	6.01	-
MINEC	1	6.47	5.38	4.17	1.96	2.30	0.46
AL	3	5.40	5.16	4.96	0.81	0.44	0.16
MTYPS	4	2.61	1.41	2.17	1.81	0.44	-
INJUVE	1	2.16	0.25	0.42	0.24	1.75	1.41
CONAMYPE	1	0.89	0.74	0.38	0.37	0.51	-
SE - MJSP	2	0.14	0.07	0.13	0.05	0.01	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	27	195.16	167.38	62.22	60.26	132.94	7.05
CEL	8	160.71	140.16	43.61	43.62	117.10	-
CEPA	1	20.96	20.97	13.40	13.40	7.56	-
ANDA	18	13.49	6.25	5.21	3.24	8.28	7.05
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	70	174.56	97.15	104.58	70.55	69.98	26.74
FOVIAL	6	80.88	43.29	65.53	39.78	15.35	14.94
FISDL	21	68.33	41.89	25.15	23.61	43.18	8.88
CNR	1	8.93	3.16	6.24	2.12	2.69	2.29
ISSS	4	5.30	0.95	5.01	0.50	0.29	-
UES	19	5.13	3.01	-	2.42	5.13	0.03
CENTA	1	1.95	1.40	0.82	0.51	1.14	-
ISTU	4	1.68	1.68	1.21	1.11	0.47	-
ISNA	1	0.69	0.65	0.22	0.22	0.46	-
ISRI	3	0.60	0.30	-	-	0.60	0.60
ISDEMU	4	0.58	0.33	0.40	0.28	0.18	-
INDES	6	0.49	0.49	-	-	0.49	-
OTRAS	13	5.02	3.72	3.00	2.69	2.01	0.10
FONAVIPO	8	2.27	1.58	1.45	1.24	0.82	0.01
FONAES	3	2.02	1.50	0.91	0.84	1.10	-
FSV	2	0.73	0.64	0.64	0.61	0.09	0.09
SUB-TOTAL	363	767.56	493.52	391.78	243.26	375.78	117.34
FODES		260.90	195.67	260.90	195.67	-	-
TOTAL		1,028.46	689.19	652.68	438.93	375.78	117.34

2.6 Avance al mes de septiembre por Programa y Presupuesto

En el siguiente cuadro se reportan los montos programados del año y al mes de septiembre, así como los montos ejecutados, comprometidos y no comprometidos; y dentro de éste último los recursos que se encuentran en procesos administrativos.

Cuadro No.2
Avance del PAIP 2015 por Programa y Presupuesto al mes de septiembre
(En millones US\$)

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de septiembre	Ejecutado al mes de septiembre	COMPROMETIDO			NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
PROYECTOS REGULARES	656.07	400.31	182.12	290.93	182.12	108.81	365.14	115.45	249.69
IDA	1.81	1.47	1.05	1.33	1.05	0.28	0.47	-	0.47
Depresión Tropical 12E	3.00	1.06	0.03	0.03	0.03	-	2.98	-	2.98
PROVISIONES 2014	87.65	74.48	51.66	87.65	51.66	35.99	-	-	-
PEIS	19.03	16.20	8.40	11.84	8.40	3.44	7.19	1.89	5.30
Subtotal	767.56	493.52	243.26	391.78	243.26	148.52	375.78	117.34	258.44
FODES	260.90	195.67	195.67	260.90	195.67	65.23	-	-	-
TOTAL	1,028.46	689.19	438.93	652.68	438.93	213.75	375.78	117.34	258.44

2.7 Proyectos con mayores montos programados para el 2015

El cuadro No.3 contiene el detalle de los 10 programas/proyectos cuya inversión programada para el año 2015, de forma conjunta concentran el 48.8%, del PAIP vigente sin FODES, por valor de \$767.56 millones, con los montos programados y ejecutados al mes de septiembre.

Cuadro No.3
LISTA DE LOS 10 PROYECTOS DEL PAIP 2015, CON MAYOR INVERSION PROGRAMADA
(Montos en millones de US\$)

PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE
Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	67.25	58.15	41.32
Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	55.99	50.55	2.06
Programa de Mantenimiento Periódico Año 2015	44.11	24.64	25.72
Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	39.47	20.66	14.27
Programa Sistema de Protección Social Universal	34.21	20.53	13.62
Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	33.33	29.64	0.18
Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	27.38	12.08	3.48
Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios	27.22	20.01	14.88
Mejoramiento de Vías e Intersecciones a Nivel Nacional	23.41	7.59	4.83
Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Area Metropolitana de San Salvador	22.40	10.94	5.26
	374.77	254.79	125.62

2.8 Inversión Programada / Ejecutada con Recursos PEIS.

El PAIP vigente al mes de septiembre contiene \$19.03 millones de recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), de los cuales se reporta una ejecución de \$8.40 millones, por parte del MINSAL, la UES y el MOP.

Cuadro No.4
Inversión 2015 con recursos PEIS
(Montos en millones de US\$)

Instituciones	Programa anual vigente	Programado al mes de septiembre/15	Ejecutado al mes de septiembre/15
MINSAL	9.54	9.13	1.74
UES	4.83	2.80	2.42
MOP	4.45	4.24	4.24
ANDA	0.13	0.00	0.00
MAG	0.06	0.005	0.00
MINED	0.02	0.02	0.00
TOTAL	19.03	16.20	8.40

A continuación se detallan los programas/proyectos que conforman el PAIP 2015 vigente al mes de septiembre, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 12 de octubre de 2015, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
GOBIERNO CENTRAL						
VMVDU		7	67,322,860.80	41,950,211.52	25,696,212.97	61.25
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS		27,216,046.82	20,010,129.73	14,876,894.16	74.35
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		22,397,267.94	10,938,814.82	5,256,857.49	48.06
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"		7,752,692.34	5,317,508.90	3,383,770.08	63.63
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		5,553,480.00	2,940,281.09	1,363,404.42	46.37
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		3,429,370.00	1,769,473.28	-	-
5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.		500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.		474,003.70	474,003.70	315,286.82	66.52
MOP		58	62,247,870.06	29,048,893.99	21,482,988.45	73.95
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		10,112,787.00	-	-	-
5492	PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO		7,315,029.00	-	-	-
5601	RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CHA07E TRAMO: EST. 13+000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO, MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		5,198,319.49	4,119,631.59	3,440,515.24	83.52
6163	Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II		4,145,324.00	1,302,575.66	1,331,073.78	102.19
5806	Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento de Usulután.		3,908,987.43	2,723,281.99	1,223,354.47	44.92
6061	Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador - LAIF		3,594,470.00	651,806.43	493,624.37	75.73
6022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE (RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES)		3,096,803.47	1,394,844.91	1,071,402.18	76.81
4303	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MOR15W TRAMO:CA07N – ARAMBALA – JOATECA, MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y JOATECA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN		2,739,332.00	2,248,123.62	1,153,904.87	51.33
5564	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO		2,094,751.50	2,094,751.50	1,998,997.48	95.43
5823	Reconstrucción de la Ruta CHA04E/CHA07E, Tramo: Chalatenango-Desvio Chiapas - Bypass Chalatenango, Departamento de Chalatenango.		2,078,432.39	1,907,394.72	1,419,839.62	74.44
4638	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN		2,028,526.82	2,028,526.82	2,028,526.82	100.00
5350	Construcción de Obras de Drenaje y Obras de Mitigación en Cauce del Río Las Cañas, Reparto El Pepeto III, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		1,703,216.37	1,629,766.54	1,292,528.44	79.31
5914	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA09S: SAN MIGUEL DE MERCEDES - SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		1,636,311.00	1,493,301.04	949,661.48	63.59
5915	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA08S: TRAMO ET. CHA09S - POTONICO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		1,562,196.00	1,422,880.22	339,599.55	23.87
4531	Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvio a Comasagua). La Libertad		1,145,988.18	1,145,988.18	1,145,988.18	100.00
5468	Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente		1,071,246.00	-	-	-
4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD		1,063,575.16	1,063,575.16	1,063,575.16	100.00
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		945,053.53	564,397.18	504,493.30	89.39
5043	Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo		808,155.00	-	-	-
6416	Obras de Protección en Bosques de Prusia, Municipio de Soyapango, San Salvador - Etapa 1		700,000.00	600,000.00	200,000.00	33.33
5926	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581		629,591.75	314,285.88	174,872.14	55.64
5477	CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE TEMPORAL, SOBRE RIO TIHUAPA, CA02, CANTON CANGREJERA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		570,339.40	570,339.40	459,868.89	80.63
4566	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)		489,389.00	-	-	-
6096	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS EN EL PERÍMETRO SUR DE FINCA EL ESPINO, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD		472,584.39	272,584.39	143,523.75	52.65



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
6160	Obras de Mitigación en Taludes y Cárcava de Comunidad Santa Maria, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador		400,000.00	400,000.00	200,000.00	50.00
5623	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067		393,698.00	186,520.33	172,638.85	92.56
5352	Reconstrucción de Obras de Mitigación en zona de Obra de Paso, acceso Principal a Reparto Jardines de San Bartolo, Ilopango, Departamento de San Salvador.		374,336.30	374,336.30	365,823.19	97.73
5924	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LOTIFICACIÓN CAMPO AMOR, MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		250,000.00	250,000.00	-	-
6236	Reparación de Calle ubicada en la zona La Mora que conecta con comunidades de Mazatepeque, Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.		250,000.00	1,377.12	1,377.12	100.00
6234	Colocación de Carpeta Asfáltica en calle que conduce de Jucuarán al Caserío El Almendro, Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután.		200,000.00	9,447.01	8,902.31	94.23
6228	Concreteado Hidráulico en la calle que conduce a Caserío Las Aradas, Cantón San Antonio Las Iglesias, Municipio de San Luis La Reina, Departamento de San Miguel.		133,485.67	2,169.66	2,169.66	100.00
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		129,007.51	107,058.48	75,363.46	70.39
6235	Pavimentación de tramos en calle del Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente.		100,000.00	-	-	-
6233	Pavimentación de calles de comunidades en Juajoyo, El Gran Zazo, Flor de Fuego y Miramar, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente.		100,000.00	1.75	-	-
6056	Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		93,466.11	93,466.11	93,466.10	100.00
4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad		82,813.89	-	-	-
6050	Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión		56,650.00	56,650.00	56,650.00	100.00
6237	Colocación de Carpeta Asfáltica en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador en Santa Ana, Departamento de Santa Ana		53,169.05	-	-	-
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR		52,225.03	1,200.00	-	-
6227	Concreteado Hidráulico de calle en Cantón el Jobo, Sector los Romeros, Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel.		50,000.00	1,048.11	1,048.11	100.00
6229	Mejoramiento de Calle que conduce de Quezaltepeque a varios Caseríos de la zona norte del Municipio de Quezaltepeque, Departamento de la Libertad.		50,000.00	-	-	-
6230	Obras de Mitigación en Río Colón, Municipio de Colón, Departamento de La Libertad.		50,000.00	2,540.01	2,540.01	100.00
6232	Construcción de Acera Peatonal y Muro de contención sobre la 31 Calle Poniente, entre la 10 Ave. Sur y Calle Al Chupadero, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana		49,984.98	3,419.16	3,419.16	100.00
6225	Reparación de Calle a Cantón Calle Nueva, Municipio de Guazapa, Departamento de San Salvador.		45,000.00	-	-	-
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		43,406.48	-	-	-
6226	Reparación de Calle de Colonia Nueva Esperanza, Bosques del Río, Municipio de Guazapa, Departamento de San Salvador.		40,000.00	-	-	-
6224	Reparación de calle Antekirta II, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		25,000.00	2,706.45	174.4	6.44
6231	Construcción de Calle de acceso al Parque recreativo María Monge de Orellana, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad.		25,000.00	1,949.65	1,949.65	100.00
4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad		24,400.00	-	-	-
6054	Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador		16,480.20	-	16,480.20	-
6051	Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		11,337.12	-	11,337.12	-
6057	Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Barío y El Cereto, Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán		10,897.59	-	10,897.59	-
5737	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE		6,948.62	6,948.62	6,948.62	100.00
6052	Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz		6,526.31	-	6,526.31	-
6053	Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador		5,100.15	-	5,100.15	-
4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad		3,701.45	-	-	-
6055	Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad Chandanta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador		3,417.76	-	3,417.76	-
6047	Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		1,408.96	-	1,408.96	-
MINSAL		123	58,391,633.12	41,068,761.64	12,358,778.63	30.09
5209	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud		27,384,413.46	12,076,231.03	3,480,690.12	28.82
5128	Programa Integrado de Salud		9,827,257.59	8,972,166.53	4,412,207.52	49.18
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		6,798,279.84	6,798,279.84	881,090.22	12.96
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		6,304,936.61	6,282,380.35	1,372,082.43	21.84
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR		1,995,840.00	1,251,800.00	23,275.40	1.86
6171	EQUIPAMIENTO MEDICO PARA SEIS HOSPITALES Y SIETE UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR A NIVEL NACIONAL		1,520,858.05	1,520,858.05	1,520,858.05	100.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		881,736.59	881,736.59	-	-
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		524,944.02	523,463.26	162,410.82	31.03
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		387,205.14	5,478.18	115.64	2.11
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		373,797.59	373,797.59	253,351.13	67.78
6135	Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Boquín, Polorós, La Unión		306,825.00	303,362.00	-	-
6132	Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B El Mozote, Meanguera, Morazán		280,000.00	276,869.00	-	-
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		240,220.06	240,220.06	370.00	0.15
4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"		239,675.77	239,675.77	130,919.17	54.62
4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		235,373.61	235,373.61	48,700.00	20.69
6119	Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B Cantón San Julián, San Jorge, San Miguel		210,568.00	210,568.00	-	-
5766	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO, USULUTÁN.		118,591.00	118,591.00	40,045.66	33.77
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		104,298.05	104,298.05	-	-
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		83,325.91	80,125.91	115.64	0.14
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		77,810.27	77,810.27	-	-
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		42,299.61	42,299.61	-	-
5773	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN		37,706.82	37,706.82	11,508.29	30.52
4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate		31,801.27	31,801.27	-	-
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		27,810.18	27,810.18	-	-
4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.		22,911.76	22,911.76	-	-
4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador		15,907.10	15,907.10	6,706.31	42.16
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel		15,583.35	15,583.35	-	-
5832	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután		12,521.00	12,521.00	-	-
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		12,347.28	12,347.28	521.31	4.22
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión		10,943.47	10,943.47	1,974.06	18.04
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador		10,569.04	10,569.04	115.64	1.09
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		10,522.43	10,522.43	231.28	2.20
4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión		9,687.48	9,687.48	375.00	3.87
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana		8,464.45	8,464.45	231.28	2.73
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		8,369.83	8,369.83	-	-
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		8,336.88	8,336.88	-	-
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		8,261.43	8,261.43	231.28	2.80
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión		8,223.26	8,223.26	-	-
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		8,067.95	8,067.95	-	-
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		7,388.02	7,388.02	-	-
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel		7,378.35	7,378.35	231.28	3.13
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		6,890.73	6,890.73	231.28	3.36
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		6,856.68	6,856.68	-	-
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas		6,473.25	6,473.25	793.63	12.26
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		6,069.14	6,069.14	231.28	3.81
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad		5,733.94	5,733.94	231.28	4.03
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana		5,411.58	5,411.58	616.62	11.39
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate		5,389.50	5,389.50	231.28	4.29
4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas		5,371.31	5,371.31	721.31	13.43



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepcion, Cuscatlán		4,910.82	4,910.82	-	-
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoyo, Olocuilta, La Paz		4,825.72	4,825.72	705.45	14.62
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador		4,680.20	4,680.20	815.15	17.42
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		4,440.54	4,440.54	-	-
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		4,193.00	4,193.00	-	-
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		3,696.19	3,696.19	-	-
4876	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		3,551.04	3,551.04	-	-
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		3,499.95	3,499.95	1,271.05	36.32
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		3,441.64	3,441.64	-	-
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		3,377.58	3,377.58	-	-
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		3,063.20	3,063.20	-	-
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matias, La Libertad		2,833.74	2,833.74	115.64	4.08
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana		2,798.84	2,798.84	-	-
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		2,796.84	2,796.84	-	-
4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		2,741.10	2,741.10	231.28	8.44
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana		2,681.84	2,681.84	-	-
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán		2,577.57	2,577.57	-	-
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		2,534.20	2,534.20	398.63	15.73
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		2,509.04	2,509.04	-	-
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		2,508.64	2,508.64	632.70	25.22
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		2,351.09	2,351.09	-	-
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		2,002.93	2,002.93	-	-
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		1,927.70	1,927.70	-	-
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		1,890.73	1,890.73	-	-
4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		1,805.34	1,805.34	-	-
4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		1,755.34	1,755.34	-	-
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		1,678.58	1,678.58	-	-
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		1,600.73	1,600.72	-	-
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		1,537.34	1,537.34	-	-
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		1,517.44	1,517.44	-	-
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		1,498.00	1,498.00	-	-
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		1,493.43	1,493.43	-	-
4865	Ampliación, Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión		1,490.40	1,490.40	-	-
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana		1,486.35	1,486.35	-	-
4872	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		1,445.00	1,445.00	-	-
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		1,420.00	1,420.00	-	-
4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		1,410.94	1,410.94	-	-
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		1,396.20	1,396.20	903.70	64.73
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		1,380.09	1,380.09	-	-
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana		1,376.44	1,376.44	-	-
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz		1,281.73	1,281.73	721.31	56.28



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		1,265.00	1,265.00	-	-
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		1,223.00	1,223.00	-	-
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		1,165.00	1,165.00	-	-
4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel		1,071.34	1,071.34	-	-
4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		1,070.94	1,070.94	-	-
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		1,060.40	1,060.40	-	-
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		1,004.06	1,004.06	-	-
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		1,003.10	1,003.10	615.10	61.32
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		934.36	934.36	-	-
4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		899.50	899.50	-	-
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador		851.04	851.04	233.10	27.39
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		829.89	829.89	-	-
4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán		811.31	811.31	721.31	88.91
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		726.50	726.50	-	-
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador		587.94	587.94	-	-
4659	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		581.42	581.42	-	-
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		546.50	546.50	-	-
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		518.60	518.60	-	-
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador		490.94	490.94	-	-
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador		487.50	487.50	-	-
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador		485.00	485.00	-	-
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitán, La Paz		470.20	470.20	-	-
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)		400.00	400.00	-	-
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		386.44	386.44	-	-
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		366.50	366.50	-	-
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana		350.70	350.70	-	-
4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		320.00	320.00	-	-
4658	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.		266.09	266.09	-	-
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		248.79	248.79	-	-
4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango		209.00	209.00	-	-
4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango		205.11	205.11	-	-
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		132.94	132.94	-	-
4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa		2.87	2.87	-	-
MAG		10	53,044,925.62	30,746,239.39	20,929,052.84	68.07
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		39,469,295.00	20,657,906.53	14,273,414.06	69.09
5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)		5,782,124.18	4,706,912.51	3,833,225.43	81.44
5540	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LAS REGIONES CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR CENTRAL) - AMPLIACION		4,006,000.00	2,011,738.15	776,534.95	38.60
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)		1,334,730.00	975,905.32	961,326.16	98.51
5725	CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGION ORIENTAL CEDAF MORAZAN		1,261,715.98	1,261,715.98	126,376.34	10.02
4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)		661,804.09	661,304.09	633,850.84	95.85
5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután		378,627.94	378,627.94	272,687.72	72.02



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador		63,373.00	4,873.44	-	-
5729	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuicolas en el Departamento de Usulután.		49,437.57	49,437.57	49,378.16	99.88
5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador		37,817.86	37,817.86	2,259.18	5.97
DGCP - MJSP		7	23,824,900.00	23,462,147.84	111,539.15	0.48
5748	Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III		6,985,155.00	6,751,077.84	-	-
5899	Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		4,558,716.00	4,558,716.00	111,539.15	2.45
5897	Ampliación de Centro Penal de Izalco		4,500,920.00	4,500,920.00	-	-
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate		2,467,064.00	2,467,064.00	-	-
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos		2,457,750.00	2,457,750.00	-	-
5904	Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana		2,340,790.00	2,340,790.00	-	-
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		514,505.00	385,830.00	-	-
MINED		9	20,003,977.33	13,038,913.25	7,439,570.77	57.06
5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.		10,887,847.44	5,689,343.91	3,400,356.88	59.77
5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		3,683,090.69	2,522,764.26	1,233,081.58	48.88
5657	Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador		2,394,840.00	2,315,249.18	779,373.50	33.66
5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.		2,255,474.80	1,803,831.66	1,834,340.74	101.69
5843	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		466,470.00	466,470.00	11,990.00	2.57
5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)		297,563.99	222,563.99	179,804.49	80.79
4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR		18,065.25	18,065.25	-	-
4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN		625.00	625.00	623.58	99.77
4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARRILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD		0.16	-	-	-
CSJ		7	18,217,548.23	16,817,022.14	8,076,736.72	48.03
3243	Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla		8,768,409.32	8,619,614.93	5,199,543.50	60.32
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		3,390,092.86	3,220,241.16	2,747,407.58	85.32
3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador		2,506,880.00	2,425,000.00	-	-
6202	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2015		2,395,000.00	2,395,000.00	6,020.40	0.25
3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión		1,000,000.00	-	-	-
6019	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2014.		133,511.87	133,511.87	123,765.24	92.70
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		23,654.18	23,654.18	-	-
PNC - MJSP		5	15,559,725.36	3,426,955.83	2,071,758.90	60.45
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		4,234,789.00	293,724.92	219,335.82	74.67
5670	Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz		3,816,715.00	-	-	-
4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil		3,517,133.30	1,364,733.30	915,614.60	67.09
4747	Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC		3,156,473.24	1,236,962.14	409,281.19	33.09
5938	Fortalecimiento de las Capacidades de la Subdirección de Administración y Finanzas de la Policía Nacional Civil de El Salvador.		834,614.82	531,535.47	527,527.29	99.25
FGR		1	13,230,135.00	-	-	-
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		13,230,135.00	-	-	-
VMT		1	13,096,108.79	5,652,832.87	1,665,048.32	29.46
5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador		13,096,108.79	5,652,832.87	1,665,048.32	29.46
MARN		6	13,081,536.38	4,577,062.84	2,496,032.21	54.53
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador		8,475,734.08	1,477,621.98	258,008.26	17.46
5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL		2,735,418.30	1,616,057.30	1,616,056.30	100.00
6164	Preparación de propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. (a nivel nacional)		1,199,920.00	812,919.56	20,009.36	2.46
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural		294,970.00	294,970.00	294,932.37	99.99



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
6213	Remodelación del Edificio No.2 del MARN en San Salvador		272,506.00	272,506.00	204,037.92	74.87
6023	Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático a Nivel Nacional.		102,988.00	102,988.00	102,988.00	100.00
MH		2	10,045,517.00	1,543,927.84	1,502,312.63	97.30
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		10,000,000.00	1,543,927.84	1,502,312.63	97.30
6410	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TECHO DE MODULOS 2 Y 3, DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EN CENTRO DE GOBIERNO		45,517.00	-	-	-
SIS - CAPRES		5	7,077,579.92	920,678.80	695,315.12	75.52
6195	Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención a la Salud Integral		2,064,532.00	118,767.36	67,229.36	56.61
5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER		1,862,047.92	602,871.35	429,893.17	71.31
5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín		1,453,910.00	116,788.00	115,940.50	99.27
6196	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer a Nivel Nacional.		1,197,090.00	36,735.88	36,735.88	100.00
6206	Fortalecimiento de las Sedes de Ciudad Mujer en municipios de Comunidades Solidarias.		500,000.00	45,516.21	45,516.21	100.00
MINEC		1	6,470,387.72	5,385,483.62	1,962,801.89	36.45
6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)		6,470,387.72	5,385,483.62	1,962,801.89	36.45
AL		3	5,396,002.96	5,157,904.06	815,017.83	15.80
6204	CONSTRUCCION DE AUDITORIUM Y EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y OFICINAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN INMUEBLE CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS UBICADO SOBRE LA ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR		3,139,612.61	2,946,130.08	-	-
5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II		2,104,143.33	2,059,526.96	662,770.81	32.18
6038	RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR		152,247.02	152,247.02	152,247.02	100.00
MTYPS		4	2,608,569.64	1,412,422.82	1,810,199.18	128.16
6032	Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación, Información y Formación Profesional.		1,711,106.64	1,404,562.82	1,350,872.49	96.18
6073	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL FASE II		700,000.00	7,860.00	459,326.69	5,843.85
6438	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN OFICINA CENTRAL, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.		128,740.00	-	-	-
6435	Reparaciones en Infraestructura Oficina Regional Paracentral (Zacatecoluca), Ministerio de Trabajo y Precisión Social.		68,723.00	-	-	-
INJUVE		1	2,160,506.00	249,039.54	235,582.96	94.60
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAF		2,160,506.00	249,039.54	235,582.96	94.60
CONAMYPE		1	892,835.19	735,536.12	365,579.87	49.70
5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional		892,835.19	735,536.12	365,579.87	49.70
SE - MJSP		2	144,000.00	74,889.07	45,768.52	61.12
6211	Mejoras en las instalaciones de la DGME: Fronteras El Poy, Depto. de Chalatenango; La Hachadura, Depto. de Ahuachapán y San Cristóbal en el Depto. de Santa Ana		92,000.00	29,107.18	29,107.18	100.00
6212	Construcción de caseta de control migratorio vehicular para el tráfico pesado que circula en el puente La Amistad en frontera El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión.		52,000.00	45,781.89	16,661.34	36.39
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
CEL		8	160,712,255.00	140,162,680.00	43,615,188.27	31.12
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		67,249,725.00	58,149,040.00	41,316,303.63	71.05
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		55,985,425.00	50,545,975.00	2,057,613.33	4.07
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		33,332,655.00	29,644,715.00	175,233.87	0.59
6178	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente y Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. Etapa I		3,003,130.00	1,065,085.00	26,697.14	2.51
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		602,290.00	309,620.00	-	-
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL		339,680.00	311,520.00	-	-
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		188,050.00	125,425.00	39,340.30	31.37



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)		11,300.00	11,300.00	-	-
CEPA		1	20,965,410.00	20,965,410.00	13,400,000.00	63.91
5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador		20,965,410.00	20,965,410.00	13,400,000.00	63.91
ANDA		18	13,489,383.50	6,251,203.34	3,244,819.62	51.91
6353	Programa de Mejoramiento de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana de San Salvador - AMSS		4,087,549.00	16.95	16.95	100.00
5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.		3,999,890.46	3,097,989.96	1,410,185.12	45.52
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		2,862,694.53	2,228,351.05	1,316,972.81	59.10
6357	Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador		1,181,300.00	16.95	16.95	100.00
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		676,223.56	586,202.53	360,123.18	61.43
6217	Introducción de Agua Potable en las Comunidades San Joaquín, Galicia, La Paz, Villas del Rosario y El Rosario, del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana		173,524.00	104,114.40	-	-
6045	Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate		119,065.00	119,065.00	119,065.00	100.00
4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután.		67,717.85	-	-	-
6221	Reparación de Tuberías de Aguas Negras en Comunidad Acaxual I, Los Morritos, Casco Urbano de Acajutla del Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate		64,000.00	19,200.00	-	-
6220	Construcción de Captación de Agua Potable y Cantareras en el Barrio El Calvario del Municipio de San Emigdio, Departamento de La Paz		50,000.00	10,000.00	-	-
6222	Reparación de Tubería de Aguas Negras en Colonia Santa María, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		45,000.00	17,806.89	-	-
6044	Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario, Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas		38,439.61	38,439.61	38,439.61	100.00
4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		36,760.84	-	-	-
4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.		27,546.22	-	-	-
6219	Instalación de equipo de bombeo y tubería madre para Agua Potable, en el Cantón Lotificación Los Amates I y II del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas		25,000.00	10,000.00	-	-
6218	Construcción de Tanque en Casco Urbano del Municipio de San José Las Flores, Departamento de Chalatenango		20,000.00	20,000.00	-	-
5963	Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz		14,333.81	-	-	-
4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.		338.62	-	-	-
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
FOVIAL		6	80,876,029.34	43,288,039.59	39,773,927.52	91.88
6197	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2015		44,114,926.04	24,640,403.32	25,722,238.34	104.39
5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		23,411,924.29	7,590,627.18	4,827,948.38	63.60
6198	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2015		6,404,653.95	4,991,363.57	3,930,943.39	78.75
5845	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		5,108,059.00	4,818,541.11	4,591,279.45	95.28
6199	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2015		1,780,926.06	1,222,726.06	687,459.13	56.22
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		55,540.00	24,378.35	14,058.83	57.67
FISDL		21	68,329,405.84	41,885,529.73	23,608,450.28	56.36
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		34,208,350.00	20,529,247.22	13,621,934.96	66.35
5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I		12,962,727.20	5,793,878.18	2,018,119.85	34.83
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS		9,902,120.00	7,277,348.06	3,634,685.38	49.95
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD		5,632,236.73	3,715,950.12	2,026,552.59	54.54
5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN		2,340,855.40	1,892,800.40	1,155,760.78	61.06
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.		1,643,055.00	1,111,251.00	659,737.65	59.37
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		639,129.73	579,504.73	-	-
4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)		410,000.00	410,000.00	369,404.19	90.10
4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)		109,880.00	94,498.24	77,740.82	82.27
6252	Recarpeteo asfáltico y ampliación de la 8ª. calle poniente, 15 avenida norte y avenida central del área urbana del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.		90,000.00	90,000.00	-	-
6254	Mejoramiento del servicio de agua potable en zona alta del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate.		90,000.00	90,000.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
6249	Empedrado y fraguado en calle La Cruz, calle San Lorenzo del Municipio de Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate.		80,000.00	80,000.00	-	-
6255	Reparación en calles y pasajes de las colonias El Castillo, La Esperanza y Cantón Los Alpes, del Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad.		40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
6253	Introducción de energía eléctrica en Caserío Los Aparicio, Cantón Piedra Azul, Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel.		40,000.00	40,000.00	-	-
6250	Empedrado y fraguado en calle de la colonia Santa Anita, del Municipio de Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate.		25,000.00	25,000.00	-	-
6251	Reparación de muros y pisos en escuelas del Municipio de Anamorós, Departamento de La Unión.		20,000.00	20,000.00	-	-
6245	Construcción del pórtico de la entrada al Municipio de San Luis El Carmen, Departamento de Chalatenango.		20,000.00	20,000.00	-	-
6246	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Planta de Compostaje Municipal, Municipio Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango		20,000.00	20,000.00	-	-
6247	Concreteado de calle hacia la planta de compostaje y cancha de fútbol en Caserío Callejón, Cantón Trinidad, Municipio de El Carrizal, Departamento de Chalatenango.		20,000.00	20,000.00	-	-
6248	Mejoramiento y extensión de alumbrado público del Municipio de Arcatao, Departamento de Chalatenango.		20,000.00	20,000.00	-	-
5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER		16,051.78	16,051.78	4,514.06	28.12
CNR		1	8,933,690.00	3,157,519.34	2,116,550.09	67.03
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		8,933,690.00	3,157,519.34	2,116,550.09	67.03
ISSS		4	5,303,925.00	950,000.00	504,303.31	53.08
3585	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA		3,833,050.00	-	460,403.73	-
5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.		1,080,545.00	680,000.00	43,899.58	6.46
6158	REMODELACIÓN Y MEJORA DE QUIROFANO Y SALAS DE EXPULSIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.		290,330.00	240,000.00	-	-
5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		100,000.00	30,000.00	-	-
UES		19	5,134,626.11	3,014,248.67	2,423,435.87	80.40
3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		3,840,630.91	2,340,630.91	2,136,852.96	91.29
6223	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL PARA AULAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTE, SAN MIGUEL.		300,000.00	210,000.00	-	-
5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		253,089.25	178,089.25	78,089.25	43.85
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		230,000.00	-	-	-
5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas		182,809.78	-	-	-
5015	Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		151,357.88	151,357.88	136,296.51	90.05
5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.		98,360.20	98,360.20	36,386.72	36.99
5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.		34,831.51	-	-	-
5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		23,981.27	23,981.27	23,981.27	100.00
5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.		14,860.80	11,829.16	11,829.16	100.00
5024	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		2,573.10	-	-	-
5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central		1,762.49	-	-	-
5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas		204.32	-	-	-
5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		65.75	-	-	-
5023	Modernizacion de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.		48.91	-	-	-
5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria		34	-	-	-
5027	Modernizacion de la Administración Académica		12.38	-	-	-
5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.		2.08	-	-	-
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.		1.48	-	-	-
CENTA		1	1,948,753.36	1,401,578.45	505,038.15	36.03
5868	Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador		1,948,753.36	1,401,578.45	505,038.15	36.03
ISTU		4	1,679,519.09	1,679,519.09	1,111,626.81	66.19
5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL		500,000.00	500,000.00	14,954.35	2.99
5677	Construcción de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz.		469,447.96	469,447.96	386,601.33	82.35
3565	REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III		464,981.29	464,981.29	464,981.29	100.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
5676	Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador		245,089.84	245,089.84	245,089.84	100.00
ISNA		1	685,483.92	653,738.92	221,933.09	33.95
5840	Rehabilitación y Equipamiento del Edificio la Estrella 3, para el funcionamiento del Centro Nacional de Investigación e Información de la Niñez (CNIN) en la sede Central del ISNA, San Salvador		685,483.92	653,738.92	221,933.09	33.95
ISRI		3	600,000.00	299,997.00	-	-
4765	Mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, San Salvador		260,000.00	129,999.00	-	-
5886	Remodelación del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI, San Salvador		190,000.00	94,998.00	-	-
4761	Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en el Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, San Salvador		150,000.00	75,000.00	-	-
ISDEMU		4	580,780.00	335,060.74	282,573.00	84.33
5765	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas		300,000.00	196,812.25	174,414.50	88.62
6066	Equipamiento y fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Comunicaciones de ISDEMU San Salvador		153,410.00	39,340.20	38,539.21	97.96
5893	Construcción de obras de mejoramiento de la infraestructura de la oficina de ISDEMU Santa Ana.		119,900.00	98,908.29	69,619.29	70.39
6065	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAÑOS Y CASETA DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER- ISDEMU- ESTABLECIDAS EN EL DEPTO. SAN SALVADOR		7,470.00	-	-	-
INDES		6	486,515.00	486,515.00	-	-
6241	Construcción de piscinas semi olímpicas en polideportivo del municipio de Comacarán, departamento de San Miguel		116,515.00	116,515.00	-	-
6239	Construcción de polideportivo en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz		100,000.00	100,000.00	-	-
6244	Construcción de graderías y muro perimetral del Estadio de Pasaquina, del departamento de La Unión		90,000.00	90,000.00	-	-
6243	Mejoramiento de la cancha municipal del Caserío El Salitre, Municipio de Anamorós, departamento de La Unión		80,000.00	80,000.00	-	-
6242	Construcción de cancha de grama sintética en cantón El Coco, del municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana		50,000.00	50,000.00	-	-
6240	Construcción del Polideportivo en el municipio de Tapalhuaca, departamento de La Paz		50,000.00	50,000.00	-	-
OTRAS						
FONAVIPO		8	2,274,510.40	1,578,256.60	1,237,154.08	78.39
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		1,174,365.00	855,390.32	589,612.02	68.93
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCÍA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		324,205.00	163,495.95	155,442.27	95.07
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		301,045.00	194,414.50	184,028.28	94.66
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		198,725.00	110,744.10	103,484.38	93.44
5744	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PROYECTO HABITACIONAL DOS QUEBRADAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		186,395.40	166,867.74	134,932.90	80.86
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		86,525.00	86,525.00	69,399.92	80.21
5028	CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		2,820.00	553.59	115.27	20.82
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		430.00	265.40	139.04	52.39
FONAES		3	2,017,116.61	1,503,131.61	836,131.61	55.63
5050	PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014		973,690.36	955,005.36	521,070.74	54.56
6390	Programa Techo y Agua, Fase 2015		760,000.00	264,700.00	85,283.85	
5777	Programa Techo y Agua 2012-2013		283,426.25	283,426.25	229,777.02	81.07
FSV		2	727,000.00	636,309.65	614,709.65	96.61
6159	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DE PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.		673,000.00	587,709.65	587,709.65	100.00
5881	Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase II		54,000.00	48,600.00	27,000.00	55.56



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2015, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE FINANC. AL MES
SUB TOTAL		363	767,561,022.29	493,517,660.91	243,256,138.31	49.29
FODES			260,897,186.25	195,672,894.75	195,672,894.75	100.00
6395	Inversión Municipal a través del FODES 2015		260,897,186.25	195,672,894.75	195,672,894.75	100.00
TOTAL GENERAL			1,028,458,208.54	689,190,555.66	438,929,033.06	63.69

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 12 de octubre de 2015.
